


## ETAPA Č.1

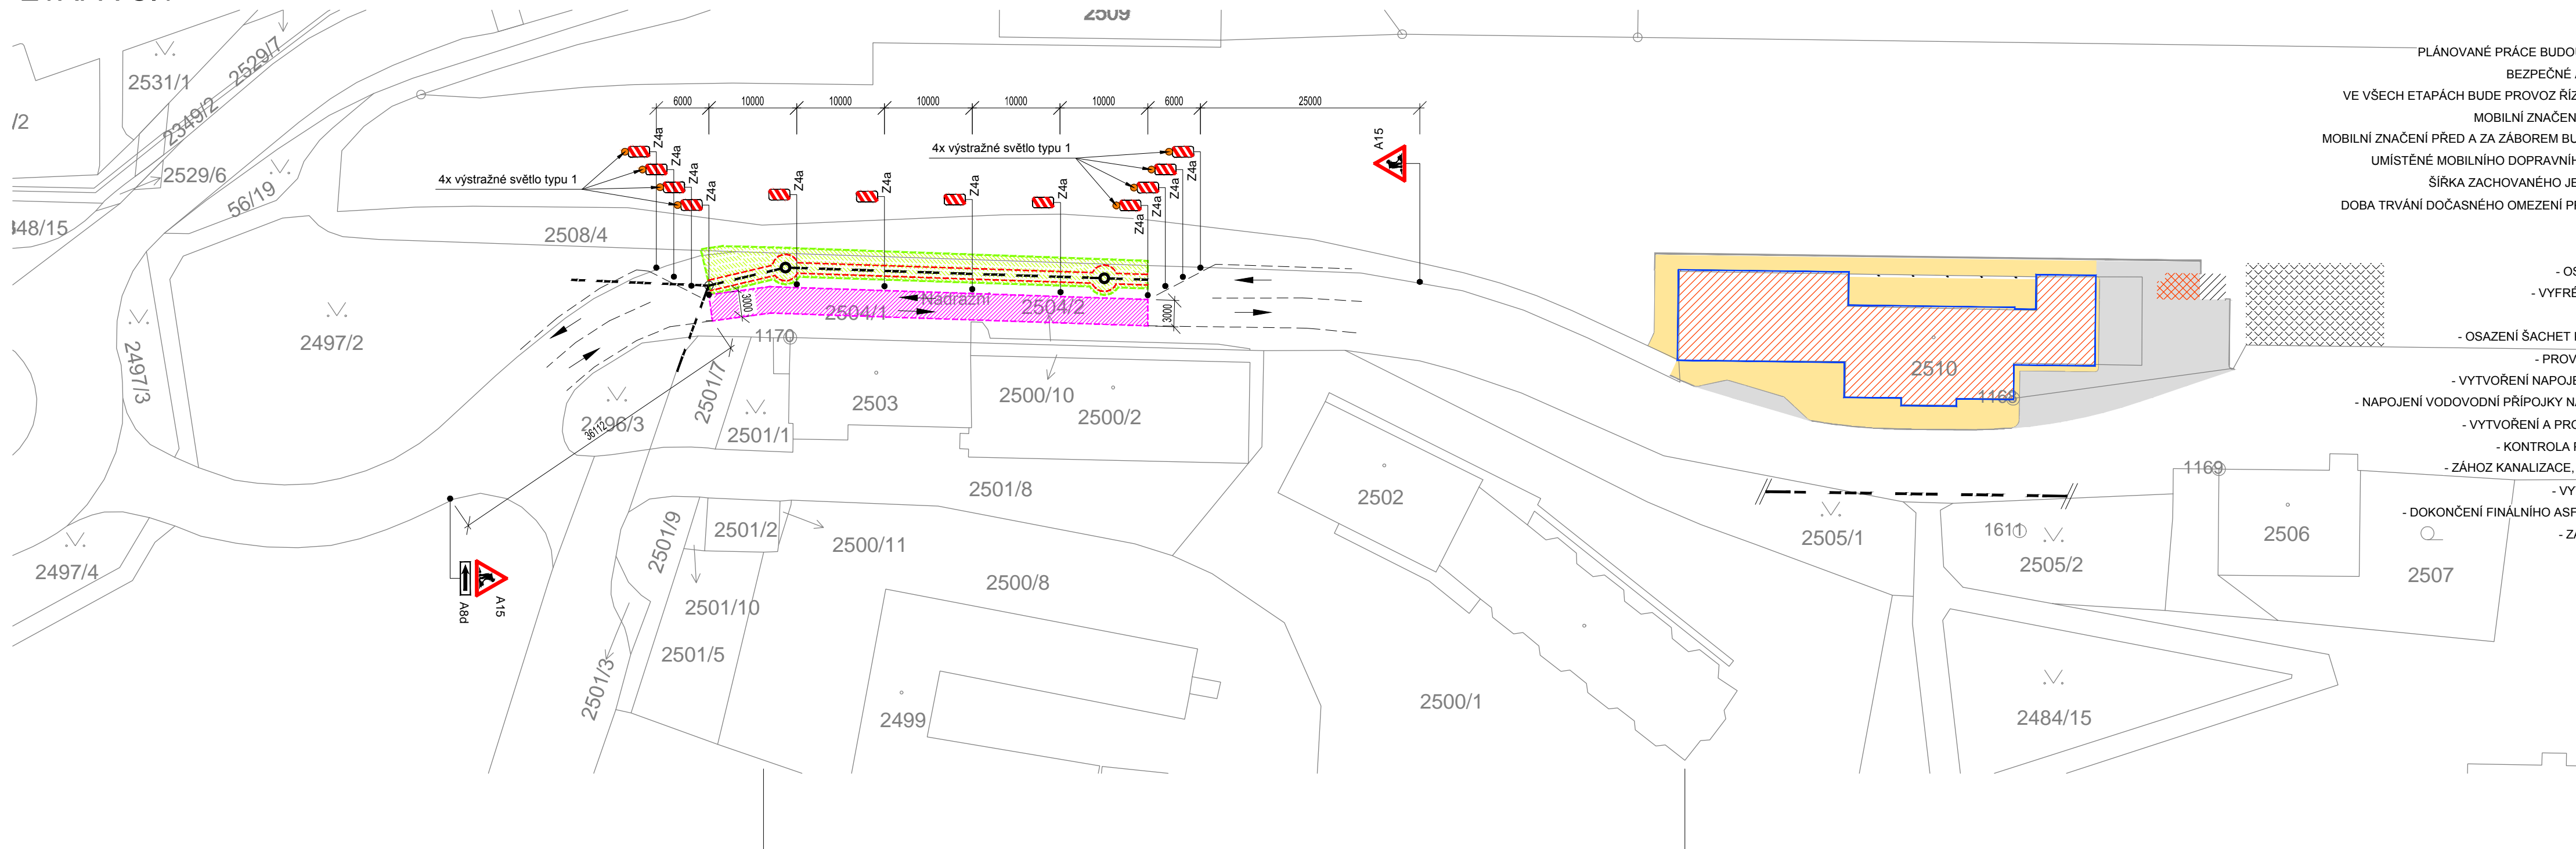

**POZNÁMKY:**  
 PLÁNOVANÉ PRÁCE BUDOU ROZDĚLENY DO PĚTI ETAP Z DŮVODU POŽADAVKY ZACHOVÁNÍ BEZPEČNÉ A PLYNULÉ PRŮJEZDNOSTI DOTČENÉ KOMUNIKACE.  
 VE VŠECH ETAPÁCH BUDE PROVOZ ŘÍZEN MOBILNÍM DOPRAVNÍM ZNAČENÍM A POUČENÝMI OSOBAMI ZHOTOVITELE.  
 MOBILNÍ ZNAČENÍ "Z4a" PODÉL ZÁBORU BUDE ROZMÍSTĚNO PO MAX 10m.  
 MOBILNÍ ZNAČENÍ PŘED A ZA ZÁBOREM BUDE ROZMÍSTĚNO ZKOŠENÉ (2m/1m) A OPATŘENO VÝSTRAŽNÝMI SVĚTLY TYPU 1.  
 UMÍSTĚNÉ MOBILNÍHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ JE VZTAŽENO K ODKAZCE V SITUACE (ČERNÝ BOD ODKAZU).  
 ŠÍŘKA ZACHOVANÉHO JEDNOPRUHOVÉHO OBOUSMĚRNÉHO PRŮJEZDU BUDE MIN. 3,0m  
 DOBA TRVÁNÍ DOČASNÉHO OMEZENÍ PROVOZU ETAPY Č. 1 A ETAPY Č.2 NA DOTČENÉ KOMUNIKACI BUDE DO 7 DNŮ.

**POSTUP PRACÍ :**  
 - OSAZENÍ MOBILNÍHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ  
 - VYFRÉZOVÁNÍ URČENÉHO ASFALTOVÉHO POVRCHU  
 - PROVEDENÍ VÝKOPOVÝCH PRACÍ  
 - OSAZENÍ ŠACHET KANALIZAČNÍHO ŘÁDU, VYTVOŘENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU  
 - PROVEDENÍ ODBOČKY NAPOJENÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ  
 - VYTVOŘENÍ NAPOJENÍ OBJEKTU REKONSTRUOVANOU PŘÍPOJKOU VODOVODU  
 - NAPOJENÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY NA VODOVODNÍ ŘÁD, PROPOJENÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ S KANALIZAČNÍM ŘÁDEM  
 - VYTVOŘENÍ A PROPOJENÍ DEŠŤOVÉ A SPLAŠKOVÉ AREÁLOVÉ KANALIZACE  
 - KONTROLA PROVEDENÉ STAVEBNÍM DOZOREM PŘED ZÁHOZEM  
 - ZÁHOZ KANALIZACE, ČÁSTI VODOVODNÍ PŘÍPOJKY A NAPOJENÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ  
 - VYTVOŘENÍ SPODNÍCH VRSTEV KOMUNIKACE  
 - DOKONČENÍ FINÁLNÍHO ASFALTOVÉHO POVRCHU ZFRÉZOVANÉ ČÁSTI DOTČENÉ KOMUNIKACE  
 - ZALITÍ SVISLÝCH SPAR MEZI ZÁLIVKOU OAT  
 - ODSTRANĚNÍ MOBILNÍHO ZNAČENÍ  
 - ZNOVUZPROVOZŇENÍ KOMUNIKACE

### LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ OBJEKT ŽELEZNIČNÍ STANICE TACHOV, DOTČENÝ STAVEBNÍMI ÚPRAVAMI
- OBJEKT TECHNOLOGIE SPRÁVY SŽDC
- PLÁNOVANÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY - POCHOŽÍ
- PLÁNOVANÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY - POJIZDNÉ
- ZAJIŠTĚNÝ PRŮJEZD ZŮŽENÍM STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE V ŠÍŘCE MIN. 3000MM
- PLÁNOVANÁ PLOCHA ZÁBORU - VYFRÉZOVÁNÍ POVRCHU ASFALTOVÉ KOMUNIKACE V TL. CCA 50MM
- PLÁNOVANÉ VÝKOPOVÉ RÝHY  
 - PRO TRASU KANALIZAČNÍHO ŘÁDU, VODOVODNÍ PŘÍPOJKY ŠÍŘKY 1200MM  
 - PRO KANALIZAČNÍ ŠACHTY Ø 3000MM
- NOVÉ NAPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH ULIČNÍCH VPUSTÍ DO NOVÉHO KANALIZAČNÍHO ŘÁDU
- PŘEDCHOZÍ ETAPOU ZREALIZOVANÁ NOVÁ TRASA JEDNOTNÉHO KANALIZAČNÍHO ŘÁDU - KT250
- NOVÁ TRASA JEDNOTNÉHO KANALIZAČNÍHO ŘÁDU - KT250
- STÁVAJÍCÍ TRASA VEŘEJNÉHO VODOVODNÍHO ŘÁDU - SPRÁVA VODÁRNÝ A KANALIZACE KARL. VARY
- STÁVAJÍCÍ TRASA JEDNOTNÉHO KANALIZAČNÍHO ŘÁDU - SPRÁVA VODÁRNÝ A KANALIZACE KARL. VARY, A.S.
- POMYSLNÉ ROZDĚLENÍ PROVIZORNÍCH JÍZDNÍCH PRUHŮ

Dopravní značení označující stavbu budou zřetelně umístěny na přehledném místě

STAVEBNÍK : Správa železniční dopravní cesty, s. o. IČO: 70994234, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1		GENERÁLNÍ PROJEKTANT : 
PROJEKTANT ČÁSTI/PROFESE : A 3 PROJEKT, s.r.o. J. V. Štěpán 699 391 81 Veselí nad Lužnicí IČO: 26046920 tel: +420 381 582 202 e-mail: a3projekt@a3projekt.cz	A 3 PROJEKT, s.r.o. J. V. Štěpán 699 391 81 Veselí nad Lužnicí IČO: 26046920 tel: +420 381 582 202 e-mail: a3projekt@a3projekt.cz	

PROJEKT : "TACHOV_stav. obnova VB + kanalizace", objekt č.p. 609, Tachov	
STUPEŇ : DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ	ČÁST/PROFESE : S
OBSAH/VÝKRES :	

## DIO BĚHEM VÝSTAVBY - 1. a 2. ETAPA

KOD/ČÍSLO VÝKRESU/PŘÍLOHY :				<b>C.5.1.</b>	
VYPRACOVAL :	DATUM AKTUALIZACE :	MĚŘÍTKO :	1:500	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :	
Ing. Zbyněk Piša	25.04.2017	VÝTISK :		ING. ZBYNĚK PIŠA	
SOUBOR :	Tachov_DSP_do_DIO_170724.dwg	ZAKÁZKA :	50/2016		

## ETAPA Č.2

